

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen "Občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY**Objednatel**

Název: **Obec Dobroměřice**
Sídlo: **Pražská 53, 440 01 Dobroměřice**
IČ: **00831786**
Statutární zástupce: **Ing. Ivana Sihlovcová, starostka obce**

Bankovní spojení: **KB Louny**
Číslo běžného účtu: **20124481/0100**
Kontaktní osoba: **Jaroslav Krejčík, technický dozor investora**
Email: **JKrejcik@seznam.cz**

Zhotovitel

Název: **HERKUL a.s.**
Sídlo: **Průmyslová 228, 435 21 Obrnice**
IČ: **25004638**
DIČ: **CZ25004638**
Statutární zástupce: **Ing. Radek Braum, předseda představenstva**
Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva
Naděžda Valdauf Vančurová, člen představenstva
Obchodní rejstřík: **Krajský soud v Ústí nad Labem, B1820**
Bankovní spojení: **UniCredit Bank**
Číslo běžného účtu: **333 222 111 /2700**
Kontaktní osoba: **Naděžda Valdauf Vančurová, obchodní ředitel**
Tel: **+420 476 440 718, +420 724 723 660**
Email: **vancurova@herkul.cz**

uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „SoD“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu:

„Oprava chodníku v ul. Komenského, Dobroměřice“

Článek 1

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v článku 2, této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

Článek 2

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dílo v plném souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací, v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků.
2. Předmětem díla je stavba „**Oprava chodníku v ul. Komenského, Dobroměřice**“. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN a EN.
3. Realizací se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení zakázky, vč. provedení všech dalších činností souvisejících se zakázkou a vyplývajících ze zadávací dokumentace. Rozsah předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci, způsob provedení v projektové dokumentaci a množství prací v soupisu prací a výkazech výměr. Předmětem plnění je dílo jako celek a dodavatel má povinnost ho jako takový ocenit. Zhotovitel díla bude respektovat výkaz výměr, ale i vlastní grafickou část PD. V případě zjištěných rozdílů mezi výkazem výměr a grafickou částí, byl dle zadávací dokumentace povinen neprodleně informovat zadavatele VZ. Pokud tyto případné rozdíly v nabídce neuvedl „pod čarou“, má se za to, že výkaz výměr a grafická část PD jsou v souladu.
4. Předmětem díla (plnění zhotovitele) je zejména:
 - kompletní provedení stavby v rozsahu dle schválené projektové dokumentace a cenové nabídky,
 - geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací,
 - zajištění uzavírek komunikací a případných dalších rozhodnutí potřebných pro realizaci stavby,
 - geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení díla včetně podkladů pro zřízení věcných břemen.
5. Součástí rozsahu předmětu díla jsou rovněž:
 - pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedení díla vynechat a jsou s ní v bezpodmínečné souvislosti,
 - úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařízení zhotovitele včetně zařízení staveniště,
 - likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou v souladu s příslušnými zákonnými předpisy.
6. Součástí rozsahu předmětu díla je také zajištění a dodávka dokladů souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy, potřebných pro řádné užívání díla a prokazujících řádné provedení díla:
 - dokumentaci skutečného provedení díla, tj. zakreslení a potvrzení provedených změn a odchylek do 3 paré projektové dokumentace + elektronicky na datovém nosiči,
 - zkoušky a revize předepsané projektem nebo ty, jejichž nutnost provedení vyplývá z technických norem a předpisů,

- dodávka dokladů od dodaných materiálů – osvědčení, atesty, prohlášení o shodě, návody k použití, apod.,
 - případná kompletace veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení.
7. Místo plnění zakázky se nachází na p.p.č. 736, 735, 734,733, 732, 71/40, 612/6 a 71/14 v k. ú. Dobroměřice, okres Louny.
8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, na své náklady a na vlastní nebezpečí.
9. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku bude mít vlastnosti a základní technické ukazatele jakosti dané:
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky,
 - projektovou dokumentací zpracovanou Projektční kanceláří in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o. (dále jen „projektová dokumentace“),
 - nabídkovou cenou zhotovitele díla ze dne 18.10.2021 vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele,
 - dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech pro provádění stavby, ČSN a EN,
 - veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu anebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla,
 - nebude mít nedostatky, které brání jeho užívání objednatelem, zejména pro účel uvedený v této smlouvě.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícím všemi potřebným znalostmi, schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému a úplnému splnění zadání objednatele v kvalitě a termínech této smlouvy. Dále zhotovitel potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost posoudit všechny takové místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Článek 3

CENA DÍLA

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce uchazeče, kterou podal do výběrového řízení „Dobroměřice, ul. U Rybníka - rekonstrukce a nová část místních komunikací“. Oceněný soupis prací a výkaz výměr tvoří přílohu této smlouvy.

Celková cena díla v Kč	
Celková cena díla bez DPH	464 056,00 Kč
DPH dle právních předpisů v době podpisu této smlouvy (21 %)	97 452,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	561 508,00 Kč

1. Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná.
2. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatel. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku URS ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen;
 - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.
3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem, resp. výkazem výměr.
4. Vícepráce či záměny materiálů budou projednány objednatel zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel zpracuje do 5 dnů cenový návrh a předá jej k odsouhlasení objednateli. Po odsouhlasení bude vícepráce provedena. Případné vícepráce budou uhrazeny zvláštní fakturou do dne vystavení konečné faktury.
5. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovený v čl. 2 této smlouvy. Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr a soupisu prací, ale z povahy díla bylo zřejmé již při zadání veřejné zakázky, že bude nezbytné je k řádnému dokončení díla provést.
6. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby.

Článek 4

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
3. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. Cena díla bude uhrazena na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem, které budou splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu
5. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací), potvrzený zástupcem objednatel ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

6. Dodavatel je povinen fakturovat měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací, a to až do výše 70% celkové ceny díla. Zbylou část do výše 100% celkové ceny díla vyfakturuje až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
7. **Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury zadavateli.** Splatnost faktur (pohledávek) začíná běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami.
8. Smluvní strany se dohodly na pětidenní lhůtě k odsouhlasení faktur. V případě, že v této lhůtě nebudou sděleny námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou.
9. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího ustanovení této smlouvy, a to do tří dnů od jejího doručení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury objednateli.

Článek 5 DOBA PLNĚNÍ

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech:

Zahájení prací/předání staveniště: 22.11.2021
Ukončení prací a převzetí hotového díla: 31. 12. 2021

- Zhotovitel zahájí práce na předmětu díla v souladu s vlastním dodaným harmonogramem prací v odevzdané nabídce po protokolárním předání staveniště - **Předpoklad předání staveniště je 29. 10. 2021** (nejdříve však po nabytí právní moci stavebního povolení).
- Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo **do 7 týdnů od protokolárního předání staveniště.**

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, přičemž tento den nastane nejpozději 10 kalendářních dní po uzavření smlouvy.

2. Pokud při předání díla nebo části díla – objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a zadavatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků zadavatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady byly odstraněny a dílo bez vad přebírá.
3. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje:
 - a. vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele,
 - b. jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí,
 - c. při dodatečných požadavcích objednatele na další stavební úpravy.
4. Smluvní strany nejsou odpovědny za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou takového nesplnění vyšší moc.
5. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, tzn. událost nebo okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopností, jež lze rozumně požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy, nepředvídatelné nevhodné klimatické podmínky, živelná katastrofa, válka, apod.).

Článek 6 PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat na převzatém staveništi veškeré platné české obecně závazné předpisy zejména všechny bezpečnostní předpisy. Zhotovitel zodpovídá za to, že práce podle této smlouvy budou provádět pouze řádně proškolení a poučení pracovníci. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže objednatel zjistí, že při provádění díla zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a po písemném upozornění na odstoupení od této smlouvy.
3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.
4. Zhotovitel se zavazuje na převzatém staveništi, vjezdech a výjezdech z něho udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho požadavky, je oprávněn dožadovat se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě, stanovené objednatelem odstraněny, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy.
6. Zhotovitel zodpovídá za práci subdodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám.
7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
8. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, je povinen oznámit změnu subdodavatele zápisem do stavebního deníku objednateli.
9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu s minimálním limitem pojistného plnění ve výši ceny díla. Při podpisu této smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit objednateli na vyžádání kopii této pojistné smlouvy.
10. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení § 157 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

12. Objednatel zajistí na stavbě výkon Technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDI minimálně jedenkrát za týden, dále dle dohody.

Článek 7 STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu SoD, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení v prostoru staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.
4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů.
9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
10. Nejpozději do 10 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 10. a to až do vyklizení staveniště.
11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Článek 8

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a doklady, které jsou nutné pro vydání vyjádření dotčených orgánů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 8. 3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

Článek 9

JAKOST DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených závaznými ustanoveními v zadávací dokumentaci a v ustanoveních této smlouvy a jejích příloh a dodatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí **60 měsíců**.
3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.

4. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamacie a obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamací může objednatel podat kdykoliv v době plynutí záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů od data reklamačního protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na technologii odstranění reklamované vady), popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijní stav. Vady mající vliv na zásobování vodou, odvádění odpadních vod a čištění odpadních vod je zhotovitel povinen odstranit v době do 24 hodin od nahlášení. Pokud zhotovitel vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady u jiného zhotovitele a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady takto vzniklé.
6. Ihned po odstranění vady je objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke kterému dni byla vada odstraněna a jakým způsobem.
7. Za vyřízení reklamacie části díla provedené zhotovitelovým subdodavatelem je vždy odpovědný přímo zhotovitel a nikoliv jeho subdodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení reklamacie odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho subdodavatel a odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky zhotovitele za jeho subdodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel si je vypořádá samostatně.

Článek 10

SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

1. Při **prodlení s termínem zahájení prací** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý započatý den.
2. Při **prodlení s termínem ukončení a předání díla** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH za 1. den prodlení a dále 5.000 Kč bez DPH za každý další den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí díla dle Článku 8 této smlouvy.
3. Při **prodlení s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků** dohodnutých v předávacím protokolu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- bez DPH za každý den prodlení až do dne jejich odstranění včetně.
4. Při **prodlení s vyklizením staveniště** je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč bez DPH za každý den prodlení až do úplného vyklizení staveniště dle této smlouvy.
5. Při **prodlení objednatele s platbou faktur** je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,25% z dlužné částky bez DPH za každý den zpoždění.
6. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.
7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dní od jejího zjištění a zapsání ve stavebním deníku, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování.
8. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

Článek 11

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů smluvních.
2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
 - prodlení s plněním díla déle než 10 kalendářních dní,
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - nedodržování příslušných platných předpisů, ČSN a EN při provádění díla,
 - neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku,
3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu v případě, že: zhotovitel pozbyde základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

Článek 12

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
2. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
6. Stavební deník bude předán Objednateli po ukončení stavby ke dni předání a převzetí stavby, a to v jednom originále a jedné kopii.
7. Do deníku zhotovitele zapisují oprávněné osoby objednatele všechny skutečnosti důležité pro věcné, termínové i kvalitativní plnění díla. Případná rozporná stanoviska stran vyplývající ze zápisů v deníku musí být řešena na nejbližším kontrolním dnu stavby.

Článek 13

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.
3. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od podpisu této SoD předložit pojistnou smlouvu na pojištění majetku – stavby, ve výši odpovídající hodnotě stavby s platností na dobu stavby / do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
4. Zhotovitel je povinen splňovat základní, profesní a technické kvalifikační předpoklady po celou dobu realizace díla (plnění veřejné zakázky).
5. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace ve veřejné zakázce prostřednictvím subdodavatele podle ust. § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění předpisů, je povinen v případě změny subdodavatele, do 5 pracovních dnů od změny subdodavatele tuto skutečnost oznámit objednateli a ve stejné lhůtě doložit doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele včetně smlouvy se subdodavatelem.
6. V případě, kdy v souvislosti s realizací díla (např. při demolici, bourání stávajících objektů) vznikne kovový odpad (železo, barevné kovy), je zhotovitel povinen tento odpad odvézt do sběrného místa (sběrný surovin), které ho vykoupí. Získaná peněžní částka náleží objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak.

Článek 14

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy ve stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvní strany, ale i dotčených orgánů státní správy (např. státního stavebního dohledu, ochrany životního prostředí, apod.).
2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách stavby nebo na kontrolních dnech.

Článek 15

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli.
2. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, nikoliv v tísní, omylu či za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují.
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou přípustné pouze formou písemných dodatků.
4. Platnost a účinnost této smlouvy, resp. jejich dodatků, nastává oboustranným podpisem statutárními zástupci smluvních stran.
5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě takto podepsaná vyhotovení.

7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:

- Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla*
Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram plnění díla
Příloha č. 3: Seznam subdodavatelů

V Dobroměřicích

dne 22. 11. 2021



Ing. Ivana Sihlovcová
starostka obce
za objednatele

OBEC Dobroměřice
Pražská 53, 440 01 Louňky
IČO: 831786 (3)
Tel. 415 679 326

V Obrnicích

dne 18. 11. 2021



Ing. Václav Roth
místopředseda představenstva
za zhotovitele



Ing. Radek Braum
předseda představenstva



Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky		Zakázka	
C-2020/11		OPRAVA CHODNÍKU V UL. KOMENSKÉHO, DOBROMĚŘICE	
Komentář			
Popis verze		Nabídka	
Komentář verze			
Adresa			
Rok		2021	
Typ Firmy		Datum zahájení	
		Datum dokončení	
Význam (funkce)		Kontaktní osoba	
Zpracovatel		Telefon	
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_01	Stavební objekt 01		
		Celkem (bez DPH)	464 056
		DPH	97 452
		DPH 21 % ze základny: 464 056	97 452
		Celkem (včetně DPH)	561 508
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis:		Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

OPRAVA CHODNÍKU V UL. KOMENSKÉHO, DOBROMĚŘICE

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	464 056	97 452	561 508
001: Zemní práce	95 027	19 956	114 982
005: Komunikace	201 477	42 310	243 787
009: Ostatní konstrukce a práce	88 994	18 689	107 682
099: Přesun hmot HSV	38 663	8 119	46 782
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	23 038	4 838	27 876
V04: Inženýrská činnost	3 500	735	4 235
V07: Provozní vlivy	5 000	1 050	6 050
V09: Ostatní náklady	1 500	315	1 815
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	6 858	1 440	8 298
Celkem (bez DPH)	464 056		
DPH	97 452		
DPH 21 % ze základny: 464 056	97 452		
Celkem (včetně DPH)	561 508		

Zakázka:

OPRAVA CHODNÍKU V UL. KOMENSKÉHO, DOBROMĚŘICE

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	Akt. CÚ
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------	---------

SO_01: Stavební objekt 01

464 056

001: Zemní práce

95 027

1.	SP	113106134		m2	5,0	29,70	149	20-I
Plný popis: Rozebření dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2								
Plný popis: Rozebření dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně								
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ CHODNÍKŮ Z BETONOVÉ DLAŽBY 200x100x60mm = 5m2								
2.	SP	113106142		m2	269,0	19,49	5 243	20-I
Plný popis: Rozebření dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2								
Plný popis: Rozebření dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně								
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ CHODNÍKŮ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 300x300x40mm = 269m2								
3.	SP	113107332		m2	48,0	250,00	12 000	20-I
Plný popis: Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2								
Plný popis: Odstranění podkladu nebo krytí strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy pi								
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH PLOCH DO TL.250mm = 48m2								
4.	SP	121151113		m2	151,0	26,29	3 970	20-I
Plný popis: Sejmутí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně								
Plný popis: Sejmутí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm								
Výkaz výměr: SEJMUTÍ ÚRODNÉ ZEMINY V TL.100mm = 151m2								
5.	SP	113202111		m	202,0	45,00	9 090	20-I
Plný popis: Vytrhání obrub krajinků obrubníků stojatých								
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajinků nebo obrubníků stojatých								
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ V BET.LOŽI S OPĚROU = 202m2								
6.	SP	122251504		m3	57,0	150,00	8 550	20-I
Plný popis: Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3								
Výkaz výměr: VÝKOPY NA ÚROVEŇ ZEMNÍ PLÁNĚ NOVÝCH KONSTRUKCÍ (S ODEČTENÍM VYBOURÁVANÝCH KONSTRUKCÍ) = 57m3								
7.	SP	174151101		m3	6,0	143,58	861	20-I
Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopu ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto vykopávkách								
Výkaz výměr: ZÁSYP ZEMINOU = 6m3								
8.	SP	162751117		m3	51,0	150,00	7 650	20-I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez razířnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálen								
Výkaz výměr: 57								
-6,0								
9.	SP	167151101		m3	51,0	34,00	1 734	20-I
Plný popis: Nakládání výkopu z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
10.	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady				
		Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	51,0	19,88	1014	20-I
11.	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04				
		Plný popis: Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	91,8	100,00	9180	20-I
		Výkaz výměr: 51*1,8		91,8			
12.	SP	181351113	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně				
		Plný popis: Rozproštění a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	155,0	15,71	2435	20-I
		Výkaz výměr: OZELENĚNÍ PŘÍLEHLÝCH PLOCH (ZEMINA/HUMUS V POMĚRU 1:1 + OSETÍ TRAVOU) = 155m2		155,0			
13.	SP	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				
		Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	155,0	21,48	3329	20-I
		Výkaz výměr: OZELENĚNÍ PŘÍLEHLÝCH PLOCH (ZEMINA/HUMUS V POMĚRU 1:1 + OSETÍ TRAVOU) = 155m2		155,0			
14.	H	00572410	osivo směs travní parková				
		Plný popis: osivo směs travní parková	kg	2,325	96,40	224	20-I
15.	SP	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5				
		Plný popis: Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	155,0	4,36	676	20-I
16.	SP	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5				
		Plný popis: Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	155,0	0,47	73	20-I
17.	SP	185802111	Hnojení půdy rašelinou v rovině a svahu do 1:5				
		Plný popis: Hnojení půdy rašelinou v rovině a svahu do 1:5	t	3,1	265,70	824	20-I
		Výkaz výměr: 155*0,40*0,05		3,1			
18.	H	103111100	rašelina zahradnická VL				
		Plný popis: rašelina zahradnická VL	m3	7,75	2680,00	20770	20-I
		Výkaz výměr: 155*0,05		7,75			
19.	SP	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
		Plný popis: Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	309,0	23,48	7255	20-I
		Výkaz výměr: 244; skládka CH šedá		244,0			
		1; varovné pásy skládka CH červená		1,0			
		47; skládka VJ červená		47,0			
		17; varovné pásy skládka VJ šedá		17,0			
				-			
20.	SP	566901161	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm				
		Plný popis: Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozproštěním a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	0,3	2500,00	750	20-I
		Výkaz výměr: ZAŘÍZNUTÍ VOZOVKY V MÍSTĚ NAPOJENÍ CHODNÍKU NA STÁVAJÍCÍ VOZOVKY (PÁS ŠÍŘKY 20cm + NÁSLEDNÉ DOBALENÍ) = 1,5m		-			
		1,5*0,2		0,3			

005: Komunikace


201 477

Průřez	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
21.	SP	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopec plochy do 15 m ² asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm Plný popis: Vyspravení krytu komunikací po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m ² asfaltovým betonem ACO (AB), po ztuhnutí tl. přes 30 do 50 mm Výkaz výměr: ZAŘÍZNUTÍ VOZOVKY V MÍSTĚ NAPOJENÍ CHODNÍKU NA STÁVAJÍCÍ VOZOVKY (PÁS ŠÍŘKY 20cm + NÁSLEDNÉ DOBALENÍ) = 1,5m 1,5*0,2	m ²	0,3	1 500,00	450	20-I
22.	SP	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou závlivkou Plný popis: Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou závlivkou Výkaz výměr: ZAŘÍZNUTÍ VOZOVKY V MÍSTĚ NAPOJENÍ CHODNÍKU NA STÁVAJÍCÍ VOZOVKY (PÁS ŠÍŘKY 20cm + NÁSLEDNÉ DOBALENÍ) = 1,5m 1,5	m	1,5	69,94	105	20-I
23.	SP	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm Plný popis: Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 200 mm Výkaz výměr: 47; skladba VI červená 17; varovné pásy skladba VI šedá	m ²	64,0	150,00	9 600	20-I
24.	SP	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m ² Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebyteč Výkaz výměr: 47; skladba VI červená 17; varovné pásy skladba VI šedá	m ²	64,0	290,00	18 560	20-I
25.	H	59245004	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná Plný popis: 47; skladba VI červená 17; varovné pásy skladba VI šedá	m ²	48,41	280,00	13 555	20-I
26.	H	59245225	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní Plný popis: 47; skladba VI červená 17; varovné pásy skladba VI šedá	m ²	17,51	400,00	7 004	20-I
27.	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm Plný popis: Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm Výkaz výměr: 244; skladba CH šedá 1; varovné pásy skladba CH červená	m ²	245,0	125,00	30 625	20-I
28.	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m ² Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebyteč Výkaz výměr: 1; varovné pásy skladba CH červená 244; skladba CH šedá	m ²	1,0	370,93	371	20-I
29.	H	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná Plný popis: 1; varovné pásy skladba CH červená 244; skladba CH šedá	m ²	1,03	350,00	361	20-I
30.	SP	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m ² Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebyteč Výkaz výměr: 244; skladba CH šedá 244;0	m ²	244,0	270,00	65 880	20-I
31.	H	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní Plný popis: 244; skladba CH šedá 246,44	m ²	246,44	220,00	54 217	20-I
32.	SP	919735113	009: Ostatní konstrukce a práce Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm Plný popis: 88 994 213	m	1,5	141,84	213	20-I

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm Výkaz výměr: ZARÍZNUTÍ VOZOVKY V MÍSTĚ NAPOJENÍ CHODNÍKU NA STÁVAJÍCÍ VOZOVKY (PÁS ŠÍŘKY 20cm + NÁSLEDNÉ DOBALENÍ) = 1,5m 1.5							
33.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	44,0	190,00	8 360
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Výkaz výměr: BETONOVÉ SILNIČNÍ OBRUBY 100/250 DO BET. LOŽE S OPĚROU = 44m 44							
34.	H	59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x300mm	m	44,0	219,00	9 636
Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 Výkaz výměr: BETONOVÉ SADOVÉ OBRUBY 50/200 DO BET. LOŽE S OPĚROU = 158m 158							
35.	SP	916331112	obrubník betonový zahradní šířky 1000x50x200mm	m	158,0	82,50	13 035
Plný popis: Odvodňovací plastový žlab s roštěm Plný popis: Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštěm mřístkovým z plastu Výkaz výměr: LINIOVÝ ŽLAB S GEOKOMPOZITOVÝM ROŠTEM (DL. 1,65m) = 4ks 1,65*4							
36.	H	59217002	obrubník betonový zahradní šířky 1000x50x200mm	m	6,6	4 800,00	31 680
Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým za zvětšený přesun do 5000 m 38 663							
37.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	219,677	47,00	10 325
Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým za zvětšený přesun do 5000 m 1 098							
38.	SP	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	219,677	5,00	1 098
Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým za zvětšený přesun do 5000 m 1 098							
39.	SP	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	219,677	5,00	1 098
Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým za zvětšený přesun do 5000 m 2 120							
40.	SP	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	141,305	15,00	2 120
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km 12 717							
41.	SP	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	141,305	30,00	4 239
Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým za zvětšený přesun do 5000 m 7 065							
42.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	141,305	50,00	7 065
Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 17 01 01							
43.	SP	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové)	t	141,305	50,00	7 065
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým za zvětšený přesun do 5000 m 7 065							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce							
45.	ON 012103000	Geodetické práce před výstavbou				23 038	
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou			kpl	1,0	11 718,00	11 718	Firemní
46.	ON 012303000	Geodetické práce po výstavbě					
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě			kpl	1,0	5 520,00	5 520	Firemní
47.	ON 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby					
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby			kpl	1,0	5 800,00	5 800	Firemní
V04: Inženýrská činnost							
48.	ON 043154000	Zkoušky hutnicí				3 500	
Plný popis: Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky hutnicí			kpl	1,0	3 500,00	3 500	Firemní
V07: Provozní vlivy							
49.	ON 072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy				5 000	
Plný popis: Provozní vlivy křížení elektrického vedení projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy			kpl	1,0	5 000,00	5 000	Firemní
V09: Ostatní náklady							
50.	ON 090001000	Vytváření sítí				1 500	
Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady			kpl	1,0	1 500,00	1 500	Firemní
VRN: Vedejší rozpočtové náklady							
51.	ON 07	Zařízení staveniště				6 858	
Plný popis:			%	1,5	4 571,98	6 858	Firemní

Oprava chodníku v ul. Komenského, Dobroměřice

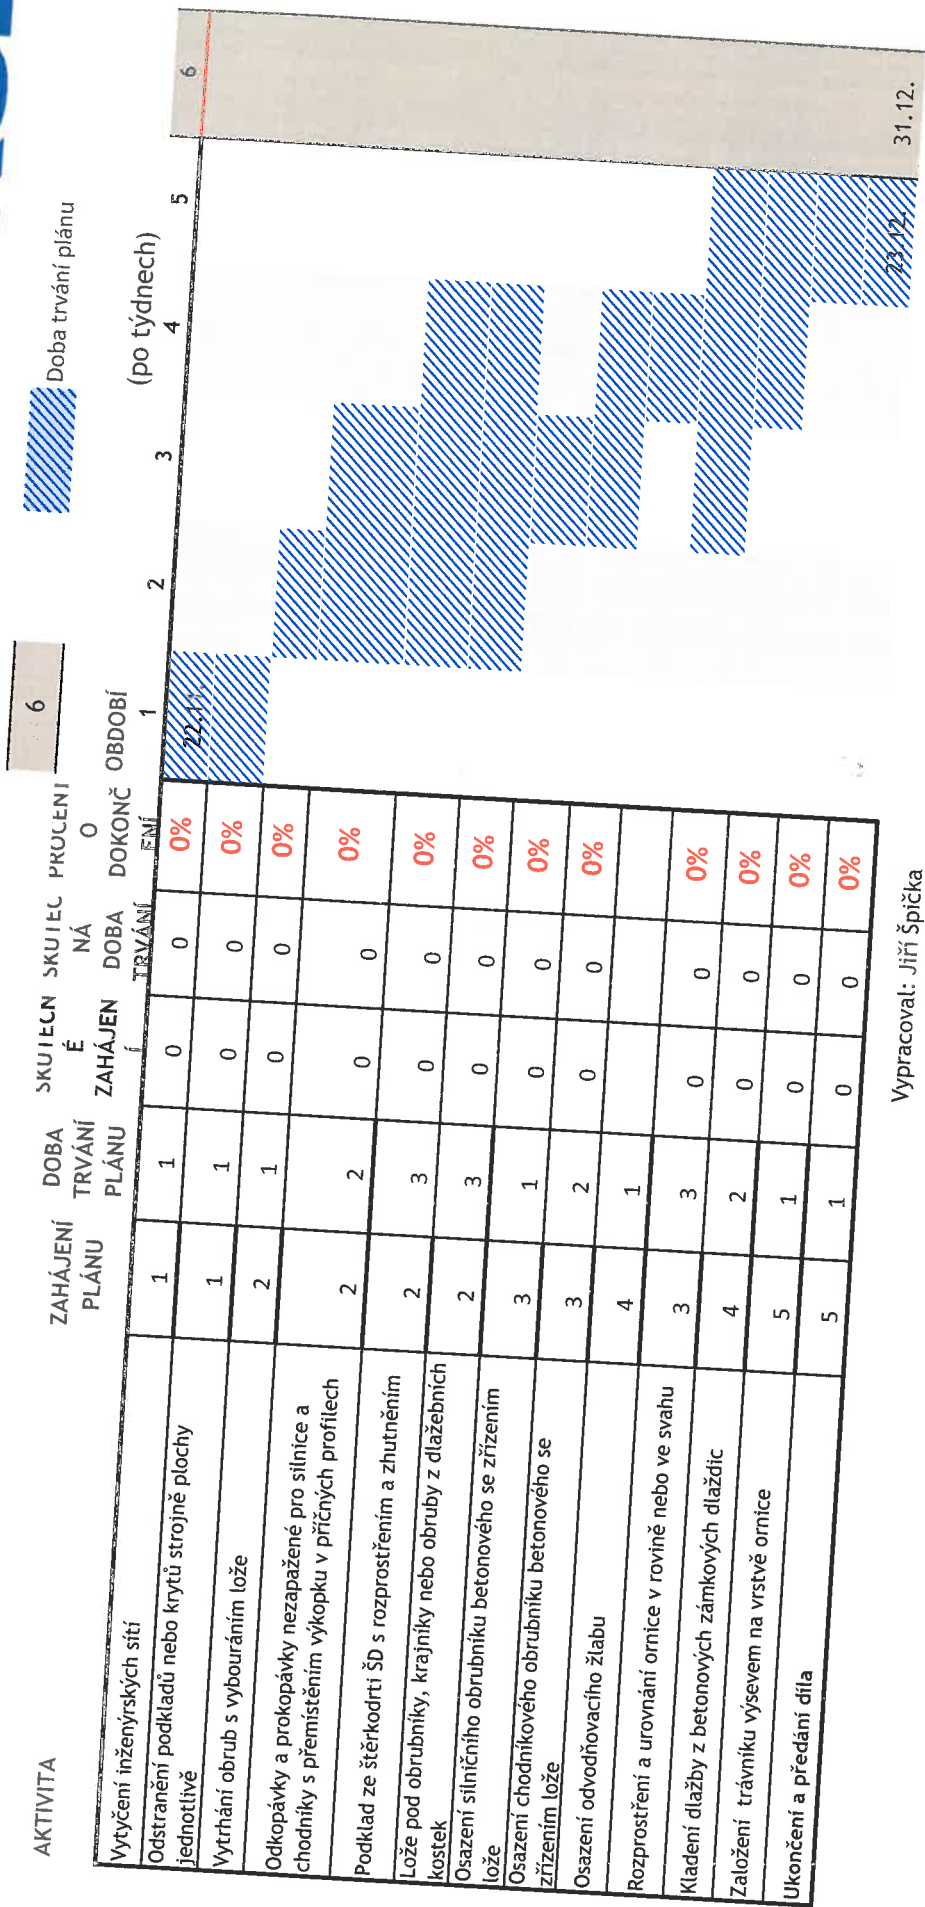

Vypracoval: Jiří Špička

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

-
poddodavatelé

Prohlašuji tímto, že jako dodavatel veřejné zakázky s názvem „Oprava chodníku v ul. Komenského, Dobroměřice“ zajistím plnění zakázky v celém rozsahu svými kapacitami bez poddodavatelů.
